


## ProcuMent on ratkaisu hallittuun hankintatoimeen

ProcuMent on rakennushankkeiden hallintajärjestelmä- kokonaisuus. Sillä laaditaan hankkeen hankinta- suunnitelma, tarjouspyynnöt ja tilaukset. ProcuMentissa on toimittajarekisteri sekä toiminnot kausisopimusten hallintaan. Lisäksi sillä hallitaan toimittajalta vaadittavat vakuudet, reklamaatiot sekä toimittajapalautteet.

ProcuMentilla hallitaan yrityksen kausisopimukset, projektin hankintojen suunnittelu sekä tarjouspyynnöt ja tilaukset. Järjestelmässä on rekisteri keskitetyn toimittajatiedon hallintaan ja luokitteluun. Hankintojen ajallinen suunnittelu tehdään PlaNetiin toteutetulla liittymällä. ProcuMentilla laaditaan projektin vastuutettu hankintasuunnitelma – tehtävineen ja –tapahtumineen.

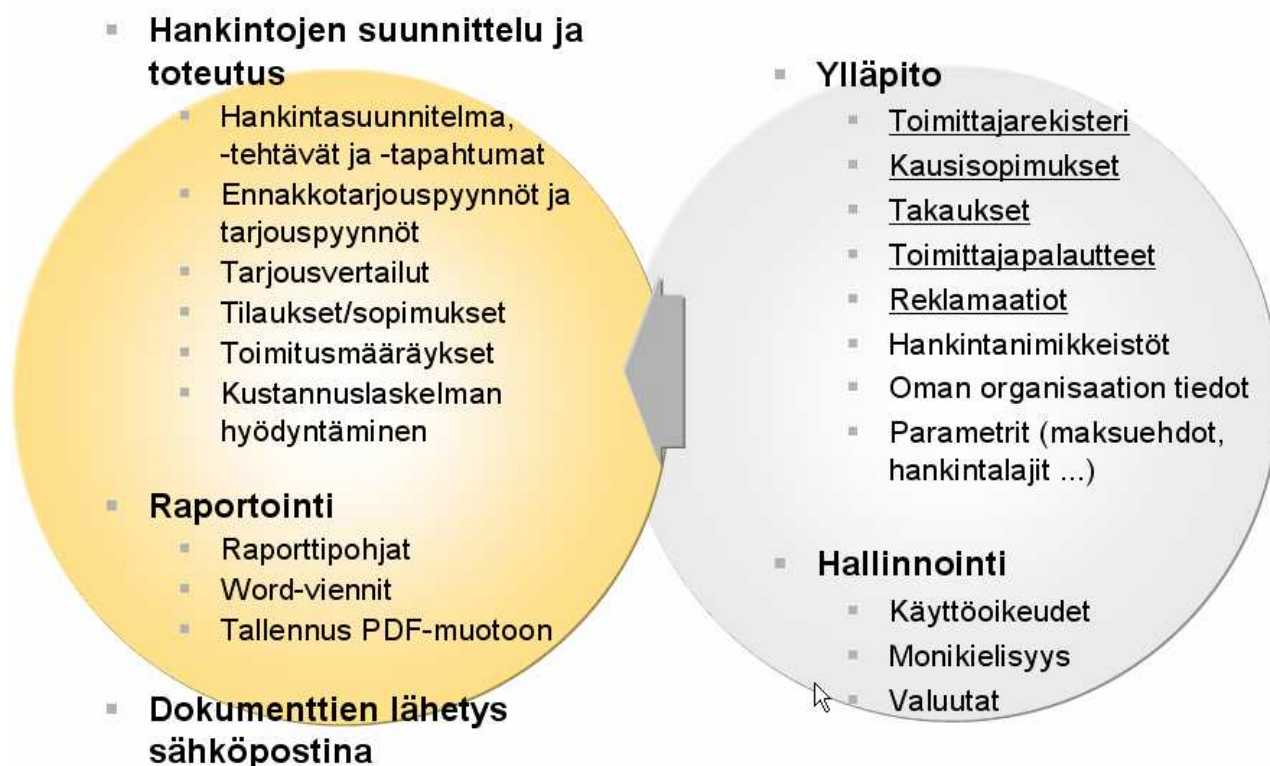

ProcuMent tukee yritystason hankintasuunnittelua sekä hankintojen ohjausta yli työmaa- ja yksikkörajojen. Sillä hallitaan mm. toimittaja- ja hankintanimikekohtaiset tilausvolyymit. Organisaatio- ja yhteyshenkilötietojen alustukset dokumenteille ja monipuoliset kopiointimahdollisuudet tehostavat dokumenttien käsittelyä. Toimittajien ja hankintatehtävien luokitus jäsentää tietomassan nopeasti ja tehokkaasti käsiteltäväksi. Dokumentit liitetään tarjouksiin ja tilauksiin. Tiedot hyväksytyjen tilausten kustannuksista ovat siirrettävissä kustannusvalvontaohjelmaan. Järjestelmään on toteutettavissa liittymiä muihinkin järjestelmiin, kuten sähköisiin ostolaskujen kierrätysjärjestelmiin.

ProcuMentin kaikki tiedot tallennetaan tietokantaan. Se mahdollistaa monipuolisen raportoinnin ja tietohaut. Tilaustiedot voidaan siirtää tekstinkäsittelyohjelmaankin. Näin mahdollistetaan toimittajakohtaistenkin tilauspohjien käyttö. Toimittajarekisteristä on tulostettavissa postitustarrat. Tarjouspyyntö- ja tilausdokumentit ovat tallennettavissa myös sähköiseen muotoon.

R57 Työmaan hankintasuunnitelma tehtävittäin

Artemis Finland Oy		TYÖMAAN HANKINTASUUNNITELMA TEHTÄVITTÄIN										HA4400	Sivu	5/6				
CI-team / awa													Pvm	07.05.02				
Työmaa		Vastuu	Tapahtumat							Tehtävä		Til.						
Nimike	Selite	Määrä	Yks.	Laji	Han	Tm	Aineisto	Tpyyntö	Tarjous	T.vert	Hyv.	Tilaus	Alku	Loppu	tila	Toimittaja	Pal.	
<b>Artemis Finland Oy</b>																		
CI CI-team																		
98765	Villa Proha																	
0370	Mallit ja koerakenteet	0						16.05.01	16.05.01	16.05.01	16.05.01	16.05.01	16.05.01	16.05.01				
1200	Maanrakennus ja ulkopuolen viemärit	0	H	JNu				26.02.01	26.02.01	08.03.01			05.04.01	08.05.01	21.05.01			
1200	Maanrakennus ja ulkopuolen viemärit	1	erä	H	TLä			Pvä	26.02.01	08.05.01	26.02.01		26.02.01	26.02.01	28.03.01			
1600	Täyttötyöt	300	m3	H	JNu			Pvä	26.02.01	08.05.01	26.02.01		08.05.01	06.03.01	03.04.01	Ok	Piikki ja Pora, LOVISA	X
1670	Routaeristeet	670	m2	H	JNu			Pvä	26.02.01	08.05.01	19.04.01		08.05.01	26.04.01	23.05.01	Ok		
1710	Vihertyöt ja kasvit A	1	erä	H	JNu			Pvä	25.05.01	15.06.01			29.06.01	06.07.01	03.08.01			
1710	Vihertyöt ja kasvit B	1	erä	H	JNu			Pvä	06.06.01	20.06.01	04.07.01		13.07.01	18.07.01	14.08.01			
1710	Vihertyöt ja kasvit C	1	erä	H	JNu			Pvä	22.06.01	06.07.01	13.07.01		31.07.01	03.08.01	27.08.01			
1730	Asfaltointi	40	m2	T	JNu			Pvä	31.07.01	07.08.01	21.08.01		31.08.01	11.09.01	27.09.01			
1820	Pihakalusteet A	1	erä	H	JNu			Pvä	03.08.01	10.08.01	17.08.01		31.08.01	14.09.01	04.10.01			
1820	Pihakalusteet B	1	erä	H	JNu			Pvä	06.08.01	13.08.01	20.08.01		03.09.01	17.09.01	04.10.01			
1820	Pihakalusteet nmbnmbnmbnmbn	0	H											16.05.01	16.05.01			
2051	Sokkellelementit	320	lm	H	TLä		JNu	26.02.01	08.05.01	26.02.01			26.02.01	14.03.01	24.04.01			
2080	Perustusten vedeneristys	700	m2	T	JNu			Pvä	26.02.01	08.05.01	28.02.01		21.03.01	11.04.01	23.05.01			
3095	Ulkopuoliset maalaukset	900	m2	H	TLä			Pvä	05.03.01	19.03.01	02.04.01		25.04.01	01.06.01	31.07.01			
3151	Pilarit	1	erä	H	TLä			Pvä	26.02.01	08.05.01	26.02.01		26.02.01	14.03.01	12.04.01			
3152	Örtelolaatat	2700	m2	H	TLä			Pvä	26.02.01	08.05.01	26.02.01		26.02.01	10.04.01	29.05.01			
3400	Porraselementit	1	erä	K	TLä			Pvä	26.02.01	08.05.01	06.03.01		20.03.01	18.05.01	20.06.01			
3536	Pellitykset	300	m2	T	TLä			Pvä	04.05.01	11.05.01	28.05.01		11.06.01	09.07.01	03.08.01			
3568	Julkisivun saumaus	1	erä	H	TSa			Pvä						21.06.01	18.07.01			
3564	Puukkinat ja parvekkeet	340	kpl	H	JNu			Pvä	20.03.01				03.04.01	18.06.01	09.07.01			
3663	Parvekkeitaiteet	1	erä	K	JNu			Pvä						14.06.01	11.07.01			
3737	Vesikattovarusteet B	1	erä	H	TLä			Pvä						24.07.01	17.08.01			
3738	Savunpoistoluukut	5	kpl	H	TLä			Pvä						15.08.01	29.08.01			
3930	VSS:n varusteet	0	H	TLä				Pvä						26.04.01	29.05.01			
4339	Paloluukut	0	JNu					Pvä										
4365	Muut puusisäoivet	0	H	TLä				Pvä										

Konsemi: Kustannuspaikka: Nimikeväli: Aikaväli:

Projekti:

- Toimipaikkaluettelot
- Työmaan toimittajat
- Työmaan vakuudet
- Hankintasuunnitelma
- Tarjouspyyntöluettelot
- Tilaukset
- Toimittajapalautteet
- Kausisopimukset
- Käyttökohteet

- Toimittajien toimipaikat yhteystietoineen (HA2110)
- Nimikkeiden toimipaikat yhteystietoineen (HA2200)
- Toimittajien perustiedot ja esivalinta (HA2600)
- Työmaan toimittajien tilaukset (HA4200)
- Työmaan tehtävien toimittajat (HA4210)
- Työmaan toimittajakuittelo (verottaja) (HA4250)
- Työmaan vakuusluettelo (HA4300)
- Työmaan hankintasuunnitelma (HA4400, HA4410, HA4420)
- (Ennako)tarjouspyyntöjen koonti (HA3400)
- Toimittajien tarjouspyynnöt (HA6100)
- Työmaiden tarjouspyynnöt (HA6110)
- Nimikkeiden tarjouspyynnöt (HA6120)
- Toimittajien tilaukset (HA5100)
- Toimittajapalautteet (HA2700)
- Toimittajapalautteen yhteenveto (HA2750)
- Kausisopimukset nimikkeittäin (HA1200)
- Kausisopimusten hintatiedot (HA1240)
- Kausisopimuksen tiedot (HA1250)
